



變更臺中市東勢都市計畫細部計畫(部分住宅區為滯洪池用地)(配合新盛自辦市地重劃)
樁位測釘案暨重劃施工後樁位恢復作業-新釘樁位公告圖

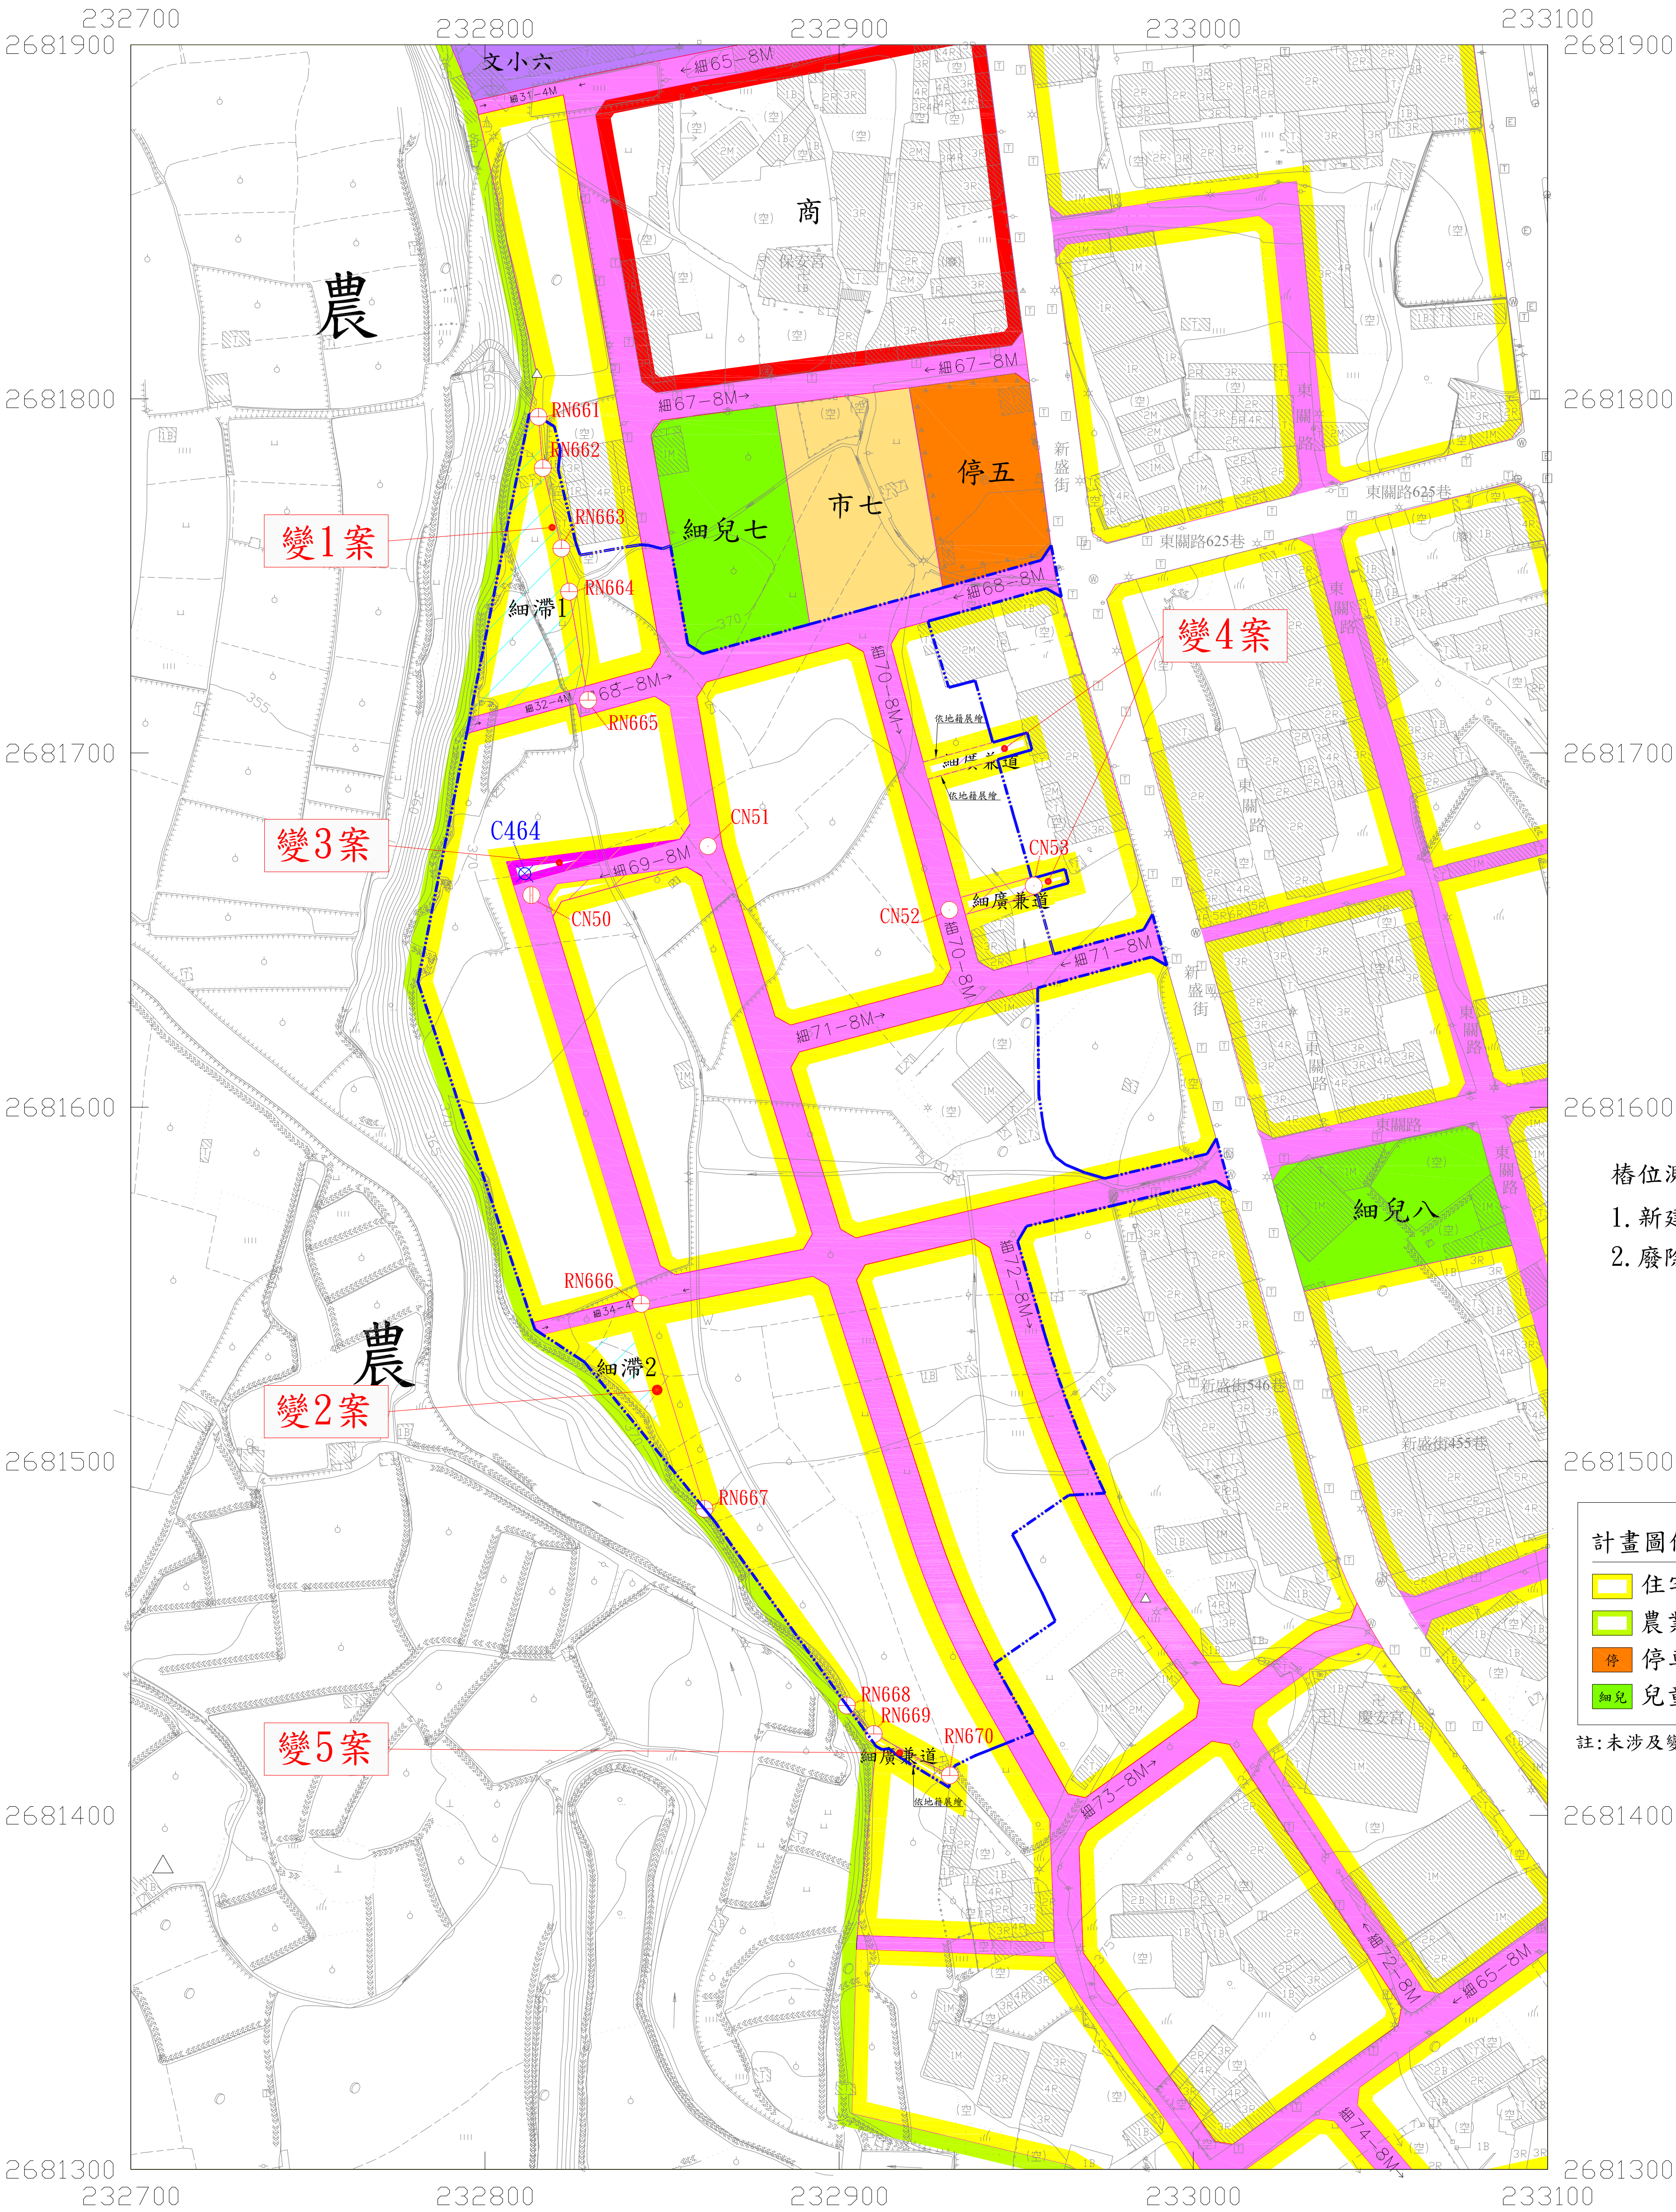

SCALE:1/1000
TWD97系統

新建樁位坐標成果表1 (TWD97系統)

序號	點 號	樁 別	橫 坐 標	縱 坐 標	備註
1	CN50	中心樁	232813.098	2681659.874	新建樁位
2	CN51	中心樁	232862.967	2681673.702	新建樁位
3	CN52	中心樁	232931.118	2681655.692	新建樁位
4	CN53	中心樁	232954.933	2681662.532	新建樁位
5	RN661	區界樁	232815.103	2681794.953	新建樁位
6	RN662	區界樁	232816.326	2681780.470	新建樁位
7	RN663	區界樁	232821.590	2681757.775	新建樁位
8	RN664	區界樁	232823.771	2681745.565	新建樁位
9	RN665	區界樁	232829.122	2681714.942	新建樁位
10	RN666	區界樁	232844.149	2681544.468	新建樁位
11	RN667	區界樁	232861.960	2681486.562	新建樁位
12	RN668	區界樁	232902.163	2681431.019	新建樁位
13	RN669	區界樁	232909.778	2681422.973	新建樁位
14	RN670	區界樁	232931.233	2681411.281	新建樁位

廢除樁位坐標成果表2

序號	點 號	樁 別	橫 坐 標	縱 坐 標	備註
1	C464	中心樁	232811.283	2681665.937	廢除樁位

圖 例

○	新建中心樁
⊕	新建區界樁
⊖	新建虛樁
⊗	廢除樁
---	重劃範圍邊界線

樁位測釘統計說明:

1. 新建樁位數量:因變更案新建樁位;中心樁4支,區界樁10支共14支.(如上表1)
2. 廢除樁位數量:因變更案廢除樁;中心樁1支.(如上表2)

計畫圖例

	住宅區
	農業區
	停車場用地
	兒童遊樂場用地

市

	市場用地
	道路用地
	市地重劃範圍

變更圖例

	變更住宅區為滯洪池用地
	變更住宅區為道路用地
	變更道路用地為住宅區
	變更住宅區為廣場用地兼供道路使用

註:未涉及變更者,均應以現行計畫為準。

主辦單位用印

測量單位用印

主辦單位:臺中市東勢區新盛自辦市地重劃區重劃會
測量單位:尚揚工程顧問有限公司 繪製

中華民國114年3月
