擬定臺中市大里地區都市計畫細部計畫(草-A-II-032計畫道路與草-河兼道交接處-南湖段248地號土地附近)樁位成果圖

比例尺：一千分之一

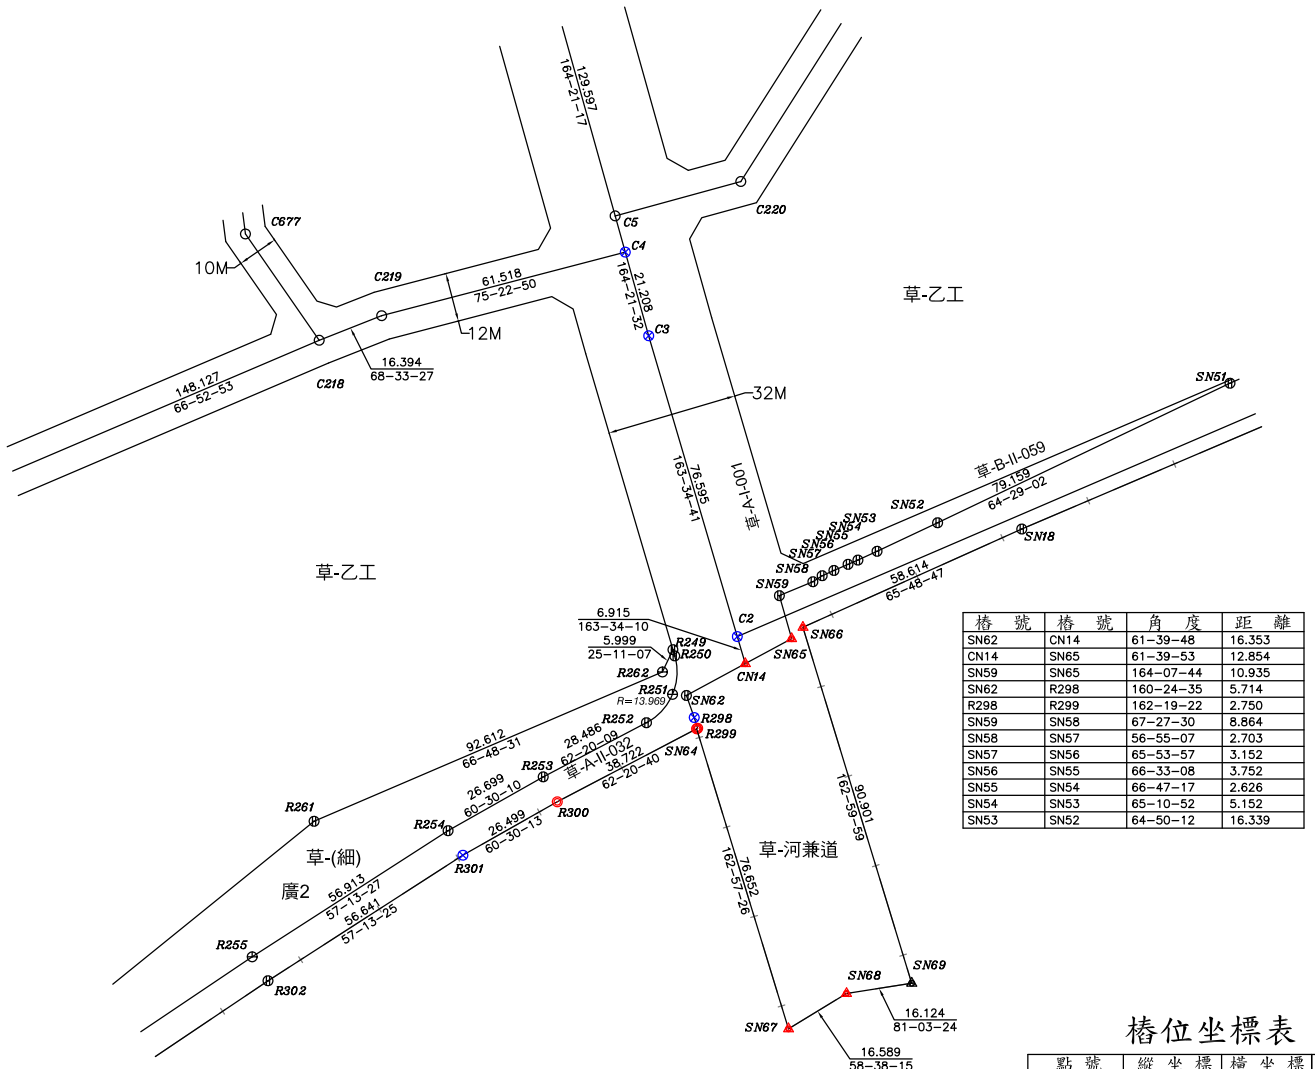

樁 號	樁 號	角 度	距 離
SN62	CN14	61-39-48	16.353
CN14	SN65	61-39-53	12.854
SN59	SN65	164-07-44	10.935
SN62	R298	160-24-35	5.714
R298	R299	162-19-22	2.750
SN59	SN58	67-27-30	8.864
SN58	SN57	56-55-07	2.703
SN57	SN56	65-53-57	3.152
SN56	SN55	66-33-08	3.752
SN55	SN54	66-47-17	2.626
SN54	SN53	65-10-52	5.152
SN53	SN52	64-50-12	16.339

樁位圖 SCALE=1/1000

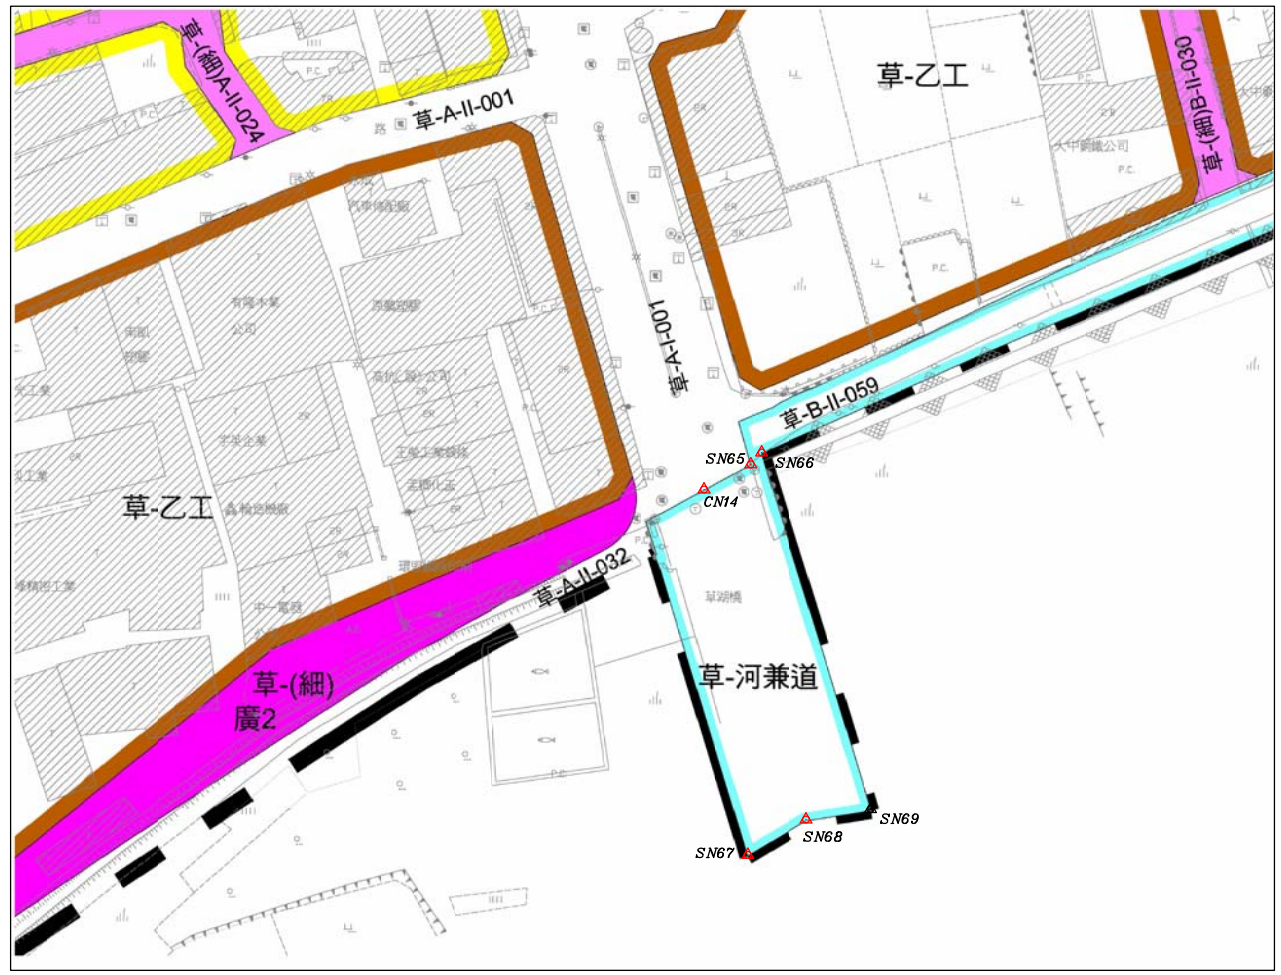

都市計畫樁位公告圖 SCALE=1/1000

樁位坐標表

點 號	縱 坐 標	橫 坐 標	備 註
C2	2663877.989	219349.429	
C3	2663951.459	219327.775	
C4	2663971.882	219322.057	
CN14	2663871.356	219351.385	
R298	2663858.211	219338.907	
R299	2663855.591	219339.742	
R300	2663837.618	219305.444	
R301	2663824.571	219282.380	
SN64	2663855.452	219339.476	
SN65	2663877.457	219362.699	
SN66	2663880.235	219365.457	
SN67	2663782.166	219361.942	
SN68	2663790.800	219376.107	
SN69	2663793.307	219392.035	
C1	2663867.609	219352.490	廢除樁位
R297	2663864.589	219353.380	廢除樁位
SN17	2663878.221	219360.877	廢除樁位
SN60	2663878.822	219362.311	廢除樁位
SN61	2663875.757	219359.546	廢除樁位

圖 例

樁別	說 明
⊙	道路中心樁
⊖	區界樁
⊕	副樁
⊛	虛樁
◬	新建樁位
◭	新建樁位(虛樁)
◎	恢復樁位
⊗	檢測樁位

控制測量成果 SCALE=1/1000

測量技師：
證書字號：台工登字第8558號

圖說編號:1009-36
測量時間:107年08月
測量單位:亞興測量有限公司
公司住址:臺中市西區臺灣大道二段101號13樓
負 責 人:江俊泓
測量人員:劉坤明
